

Малахит/Malahit

Схема монтажа Малахит 50

Вид А

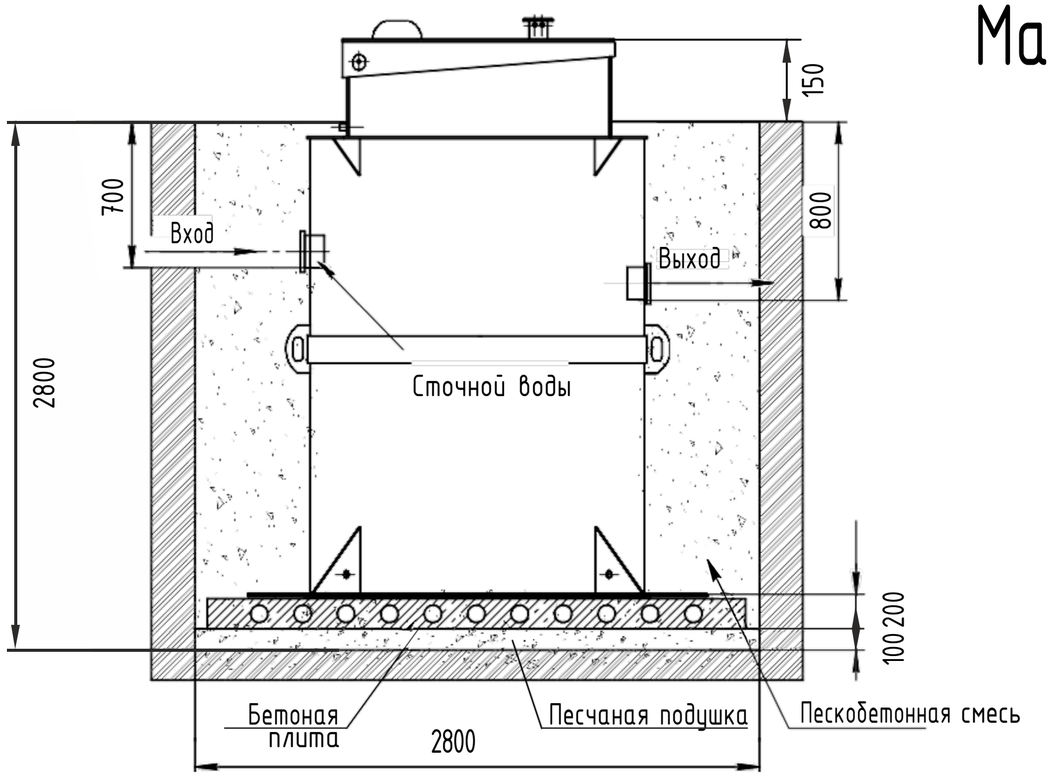


Вид сверху

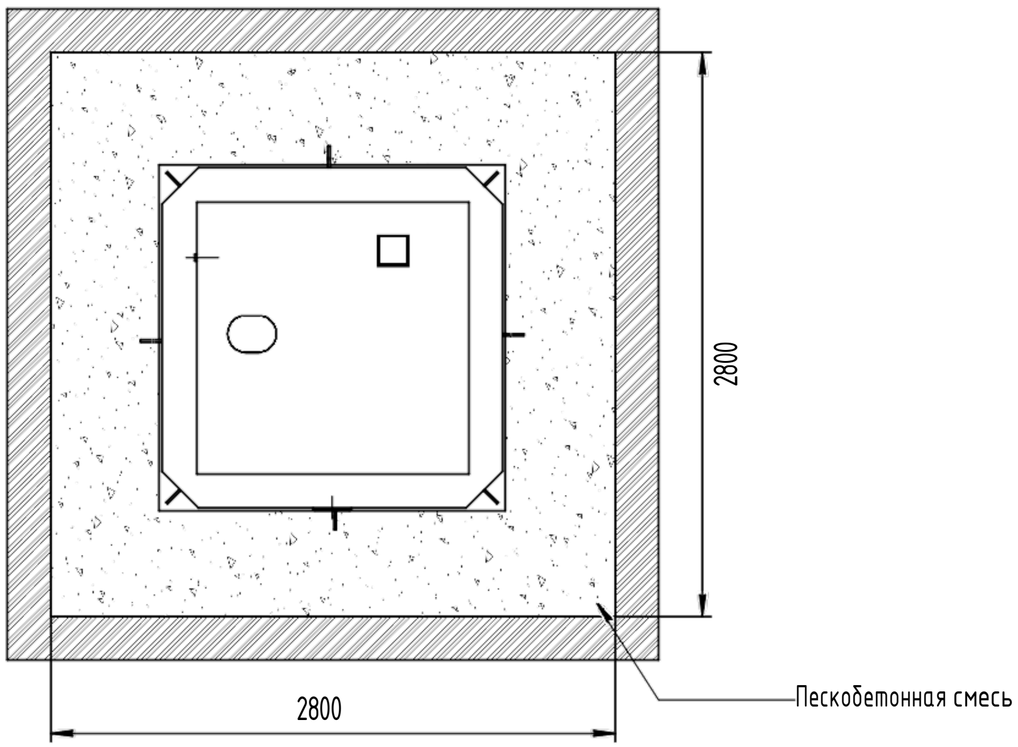

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	700
Выход очищенной воды	800

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

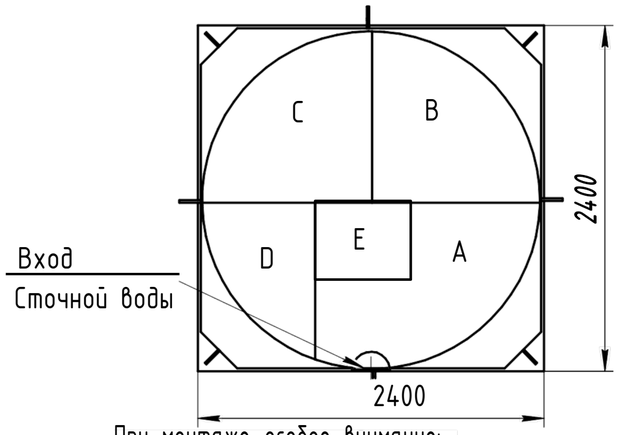

Габаритные размеры Малахит 50

Длина - 2400
Ширина - 2400
Высота - 2690

A- приемная камера
B- аэротенк
C- вторияный отстойник
D- отстойник ила
E- накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой водой одновременно, для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700 мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Д/Ш/В 2800/2800/2800
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100мм + плита 200мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 19 м^3
2. Расход воды 13 м^3
3. Объем котлована 23 м^3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малахит/Malahit	Лист 1

Копировал Формат А3-2
